

LAMPIRAN

**PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
TATA RUANG**



**KEGIATAN BIDANG SUMBER DAYA AIR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KABUPATEN KARO TAHUN ANGGARAN 2025**

SURAT PERJANJIAN

Nomor : 610/297/PPK-SDA/2025
Tanggal : 07 AGUSTUS 2025

NAMA KEGIATAN : REHABILITASI JARINGAN IRIGASI D.I NAMO LEMBU KEC. JUHAR (LANJUTAN)
PELAKSANA : CV. KATA KITA
ALAMAT : JL. KAPTEN BANGSI SEMBIRING NO. 154 KABANJAHE

TERDIRI DARI : - NILAI FISIK Rp. 435,900,904.00
- PPN Rp. 47,949,099.00
Jumlah Rp. 483,850,003.00

SUMBER DANA : APBD

PELAKSANAAN : - MASA KONSTRUKSI/FISIK : 120 HARI KALENDER
07 AGUSTUS 2025 s/d 05 DESEMBER 2025
- MASA PEMELIHARAAN : 180 HARI KALENDER

SURAT PERJANJIAN Kontrak Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi
Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.Namo Lembu Kec Juhar (lanjutan)
Nomor : 610/297/PPK-SDA/2025

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditandatangani di Kabanjahe pada hari Kamis tanggal 7 bulan Agustus tahun 2025 berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor tanggal , Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 610/291/PPK-SDA/2025, antara:

Nama : EDWARD PONTIANUS SINULINGGA, ST
NIP : 197409212005021001
Jabatan : Kepala Dinas PUTR Kab. Karo
Berkedudukan di : Jalan Jamin Ginting No. 72 Kabanjahe

yang bertindak untuk dan atas nama*) Pemerintah Indonesia c.q. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat c.q. Direktorat Jenderal Kab. Karo c.q. Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang berdasarkan Surat Keputusan 188 /808/PUTR/2025 Nomor 188/808/PUTR/2025 tentang SK pengangkatan PPK selanjutnya disebut PPK, dengan:

Nama : PRADA SITEPU
Jabatan : Wakil Direktur
Berkedudukan di : JL. KAPT. BANGSI SEMBIRING NO. 154 KABANJAHE
Akta Notaris Nomor : 02
Tanggal : 8 Februari 2018
Notaris : SRI ENDANG ERLITNA S., S.H., M.Kn

yang bertindak untuk dan atas nama CV KATA KITA selanjutnya disebut "Penyedia".

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2016;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 31/PRT/M/2015.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- a. Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan
- b. PPK telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.Namo Lembu Kec Juhar (lanjutan) sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "Pekerjaan Konstruksi";
- c. Penyedia telah menyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- d. PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- e. PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 1. telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;

2. menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
3. telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
4. telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.Namo Lembu Kec Juhar (lanjutan) dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 610/299/PPK-SDA/2025

Paket Pekerjaan : Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.Namo Lembu Kec Juhar (lanjutan)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

EDWARD PONTIANUS SINULINGGA, ST

Kepala Dinas PUTR Kab. Karo

Jl. Letjend. Jamin Ginting No. 72 Kabanjahe

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

berdasarkan Surat Perjanjian Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.Namo Lembu Kec Juhar (lanjutan) nomor 610/297/PPK-SDA /2025 tanggal 7 Agustus 2025, bersama ini memerintahkan:

CV KATA KITA

JL. KAPT. BANGSI SEMBIRING NO. 154 KABANJAHE


yang dalam hal ini diwakili oleh: PRADA SITEPU

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;


untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Macam Pekerjaan: Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.Namo Lembu Kec Juhar (lanjutan)
2. Tanggal mulai kerja: 8 Agustus 2025
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu Penyelesaian: selama 120 hari kalender (8 Agustus 2025) dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 5 Desember 2025
5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Syarat-Syarat Kontrak.

Kabanjahe, 8 Agustus 2025
Untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Pejabat Pembuat Komitmen



EDWARD PONTIANUS SULINGGA, ST
Kepala Dinas PUTR Kab. Karo
NIP. 197409212005021001
Menerima dan menyetujui:
Untuk dan atas nama CV KATA KITA



PRADA SITEPU
Wakil Direktur

**PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DINAS PEKERJAAN UMUM**



**KEGIATAN BIDANG SUMBER DAYA AIR
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KARO
TAHUN ANGGARAN 2025**

AMANDEMEN PERPANJANGAN WAKTU

Nomor : 610/444/PPK-SDA/2025
Tanggal : 05 DESEMBER 2025

NAMA KEGIATAN : REHABILITASI JARINGAN IRIGASI D.I NAMO LEMBU
KEC. JUHAR (LANJUTAN)

PELAKSANA : CV. KATA KITA

ALAMAT : JL. KAPTEN BANGSI SEMBIRING NO. 154 KABANJAHE

TERDIRI DARI :

- NILAI FISIK	Rp.	435,900,904.00
- PPN	Rp.	47,949,099.00
JUMLAH	Rp.	483,850,003.00

PELAKSANAAN : 05 DESEMBER 2025 S/D 15 DESEMBER 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KEGIATAN BIDANG SUMBER DAYA AIR
TAHUN ANGGARAN 2025

JL. LETJEND. DJAMIN GINTING KABANJAHE

TELP. (0628) 20261

BERITA ACARA PERHITUNGAN DENDA

NOMOR : 610/443/PPK-SDA/2025

Sehubungan dengan Berita Acara Perhitungan fisik Lapangan Nomor : 610/440/PPK-SDA/2025 tanggal 5 Desember 2025.

Kegiatan	: Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Namo Lembu Kec. Juhar (Lanjutan)
Nomor Kontrak	: 610/297/PPK-SDA/2025
Tanggal	: 07 Agustus 2025
Nomor Kontrak Addendum	: 610/378/PPK-SDA/2025
Tanggal	: 29 OKTOBER 2025
Perusahaan	: CV. KATA KITA WAKIL DIREKTUR /PRADA SITEPU

Berita acara Pemeriksaan Fisik di lapangan dikeluarkan pada tanggal 5 Desember 2025 presentase pelaksanaan sudah 97,71 %. Keterlambatan pekerjaan dilapangan selama 12 hari atau sebesar 1% dan diharapkan agar saudara mengembalikan uang denda keterlambatan waktu tersebut sebesar Rp. 119,784.00 (Seratus sembilan belas ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Nilai Kontrak	Rp.	483,850,003.00
Nilai Fisik	Rp.	435,900,904.00
Nilai sesuai dengan progres s/d berakhir kontrak	Rp.	425,918,773.00
Jumlah sisa terkena denda	Rp.	9,982,131.00
Jumlah denda keterlambatan sebesar 1%	Rp.	119,784.00
Jumlah yang dibayarkan	Rp.	<u>119,784.00</u>

Sesuai dengan perihal diatas maka kami harapkan kepada saudara agar segera menyetorkan kembali uang tersebut ke Kas Daerah Kab. Karo melalui **Bank Sumut Cabang Kabanjahe dengan Nomor Rekening 250.01.02.002500-0**

Demikian kami sampaikan kepada Saudara untuk dimaklumi.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum
dan Tata Ruang Kab. Karo


EDWARD PONTIANUS SINULINGGA, ST
NIP. 19740921 200502 1 001

CV. KATA KITA


PRADA SITEPU
WAKIL DIREKTUR

Tembusan :

1. Kepala Dinas/Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Karo di Kabanjahe
2. Dinas Pengelola Pendapatan Keuangan/Aset Daerah Kab. Karo di Kabanjahe
3. Inspektorat Kab. Karo di Kabanjahe
4. Pelaksana Kegiatan di Kabanjahe
5. Pertinggal

PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KEGIATAN BIDANG SUMBER DAYA AIR
TAHUN ANGGARAN 2025

JL. LETJEND. DJAMIN GINTING KABANJAHE

TELP. (0628) 20261

BERITA ACARA RAPAT TEKNIS PERPANJANGAN WAKTU KONTRAK

Nomor : 620/442/PPK-SDA/2025

Pada hari ini, Jumat tanggal Lima bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh lima kami yang bertanda tangan di bawah ini :

No.	Nama / NIP	Jabatan
1	EDWARD PONTIANUS SINULINGGA, ST	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
2	HELMIN SITEPU, ST	Pelaksana Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Namo Lembu Kec. Juhar (Lanjutan) Tahun Anggaran 2025
3	CV. KATA KITA	WAKIL DIREKTUR PRADA SITEPU

Berdasarkan Surat Permohonan Saudara Nomor : 62/CV.KK/2025 Tanggal 5 Desember 2025 CV. KATA KITA perihal Permohonan Addendum Perpanjangan Waktu, setelah kami mengadakan peninjauan dan pemeriksaan lapangan pada kegiatan :

Nama Kegiatan : Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Namo Lembu Kec. Juhar (Lanjutan)
Nomor Kontrak : 610/297/PPK-SDA/2025
Tanggal Kontrak : 07 Agustus 2025
Nomor Kontrak Addendum : 610/378/PPK-SDA/2025
Tanggal : 29 OKTOBER 2025
Pelaksana : CV. KATA KITA

Setelah melihat dan meneliti maka kami simpulkan bahwa kegiatan :
Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Namo Lembu Kec. Juhar (Lanjutan)
perpanjangan waktu dengan alasan :

- Curah hujan yang tinggi
- Susahnya memasukan bahan material kelokasi pekerjaan


Demikian Berita Acara ini diperbuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kabanjahe tanggal tersebut diatas

Pelaksana Kegiatan Bidang Sumber Daya Air
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kab. Karo


HELMIN SITEPU, ST
NIP. 19860325 200801 1 001


Kontraktor Pelaksana
CV. KATA KITA


PRADA SITEPU
Wakil Direktur

Diketahui/Disetujui :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karo
Tahun Anggaran 2025


EVARIANI BR SEMBIRING, ST.M.Si
NIP. 19770118 200212 2 001

Diketahui/Disetujui :
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Sumber Daya Air
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Karo TA. 2025
/Pegguna Anggaran (PA)


EDWARD PONTIANUS SINULINGGA, ST
NIP. 19740921 200502 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KEGIATAN BIDANG SUMBER DAYA AIR
TAHUN ANGGARAN 2025

JL. LETJEND. DJAMIN GINTING KABANJAHE

TELP. (0628) 20261

Kabanjahe, 05 Desember 2025

Nomor : 610/440/PPK-SDA / 2025
Lampiran : 1 (satu)
Perihal : **Perpanjangan Waktu Pelaksanaan**
Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi
D.I Namo Lembu Kec. Juhar (Lanjutan)

Kepada :
Sdr. CV. KATA KITA
WAKIL DIREKTUR
PRADA SITEPU
di
Tempat

1. Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor : 62/CV.KK/2025 Tanggal 3 Desember 2025 Perihal Permohonan Perpanjangan Waktu Kontrak
2. Menindaklanjuti Surat Permohonan Saudara untuk Paket Kegiatan :
Kegiatan : **Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Namo Lembu Kec. Juhar (Lanjutan)**
Nomor Kontrak : **610/292/PPK-SDA/2025**
Tanggal : **06 Agustus 2025**
Nomor Kontrak Addendum : **610/378/PPK-SDA/2025**
Tanggal : **29 Oktober 2025**
3. Untuk perpanjangan pelaksanaan pekerjaan tersebut dapat kami berikan sesuai dengan Peraturan No. 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintahan pasal 79 ayat 4 yang berlaku, dan dalam waktu yang telah ditetapkan akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai kontrak untuk setiap hari keterlambatan
4. Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Bidang Sumber Daya Air
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kab. Karo


EDWARD PONTIANUS SINULINGGA, ST
NIP. 19740921 200502 1 001

Tembusan :

1. Kepala Dinas/Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Karo di Kabanjahe
2. Pelaksana Kegiatan Sumber Daya Air di Kabanjahe
3. Pertinggal



CV. KATA KITA

General Contractor – Leasing – Supplier – Dagang Umum
J. Kapitan Dangi Sembiring ISA Kabanjahe

Nomor : 62/CV.KK/2025
Lamp. :
Perihal : Permohonan Perpanjangan Waktu Kontrak

Kabanjahe 3 Desember 2025
Kepada Yth :
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
BIDANG SUMBER DAYA AIR DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN TATA RUANG KAB. KARO TA. 2025
Di
Kabanjahe

Dengan Hormat,

Berdasarkan Kontrak Nomor :610/297/PPK-SDA/2025 tanggal 07 Agustus 2025 dan Addendum Kontrak Nomor :610/ 378 /PPK-SDA/2025 Tanggal 29 Oktober 2025 , Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Namo Lembu Kec. Juhar (Lanjutan) bahwa dalam pelaksanaan pekerjaannya dilapangan terdapat keterlambatan diakibatkan oleh :

- Curah hujan yang tinggi
- Susahnya memasukan bahan material kelokasi pekerjaan

Sehingga kami sulit untuk melaksanakan pekerjaan dilapangan sesuai dengan waktu yang ditetapkan, oleh karenanya kami mohonkan adanya perpanjangan waktu. Adapun perpanjangan waktu yang kami butuhkan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut adalah selama 15 (Lima belas) hari.

Demikian Surat Permohonan Ini Kami Sampaikan, sebelum dan sesudahnya kami ucapkan banyak terima kasih.

CV. KATA KITA



PRADA SITEPU
WAKIL DIREKTUR

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Karo di Kabanjahe
2. Pelaksana Kegiatan Bidang Sumber Daya Air di Kabanjahe
3. Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab.Karo TA.2020 di Kabanjahe
4. Peninggal.

PEMERINTAHAN KABUPATEN KARO

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KARO

FOTO DOKUMENTASI

REHABILITASI JARINGAN IRIGASI D.I. NAMO LEMBU KEC JUHAR (LANJUTAN)



CV KATA KITA

T. A 2025


Nama Kegiatan : REHABILITASI JARINGAN IRRIGASI D.I. LEMBU KEC. JUHAR (LANJUTAN)
Pelaksana : CV KATA KITA



SEBELUM
DIKERJAKAN



SEDANG
DIKERJAKAN

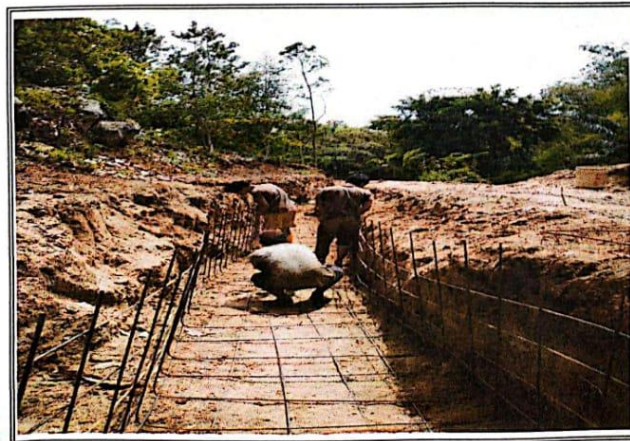

SEDANG
DIKERJAKAN

Nama Kegiatan : REHABILITASI JARINGAN IRIGASI D.I. NAMO LEMBU KEC JUHAR (LANJUTAN)

Pelaksana : CV KATA KITA



SEDANG
DIKERJAKAN



SEDANG
DIKERJAKAN



SELESAI
DIKERJAKAN

Nama Kegiatan : REHABILITASI JARINGAN IRIGASI D.I. NAMO LEMBU KEC. JUHAR (LANJUTAN)
Pelaksana : CV KATA KITA



SEBELUM
DIKERJAKAN



SEDANG
DIKERJAKAN



SEDANG
DIKERJAKAN

Nama Kegiatan : REHABILITASI JARINGAN IRRIGASI D.I. NAMO LEMBU KEC JUHAR (LANJUTAN)
Pelaksana : CV KATA KITA



SEDANG
DIKERJAKAN




SELESAI
DIKERJAKAN

Nama Kegiatan : REHABILITASI JARINGAN IRRIGASI D.I. NAMO LEMBU KEC JUHAR (LANJUTAN)
Pelaksana : CV KATA KITA



SEBELUM
DIKERJAKAN

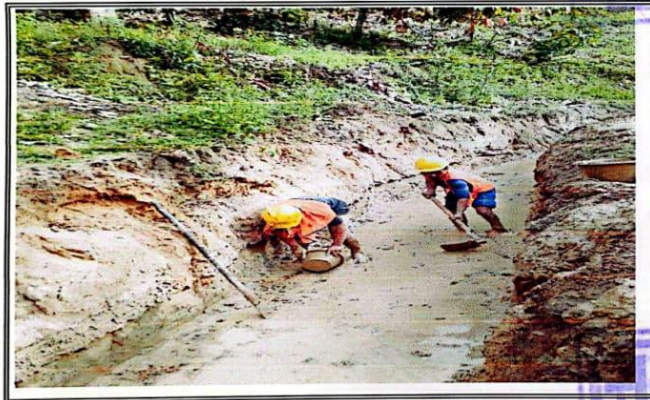

SEDANG
DIKERJAKAN




SEDANG
DIKERJAKAN

Nama Kegiatan : REHABILITASI JARINGAN IRIGASI D.I. NAMO LEMBU KEC. JUHAR (LANJUTAN)
Pelaksana : CV KATA KITA



SEDANG
DIKERJAKAN

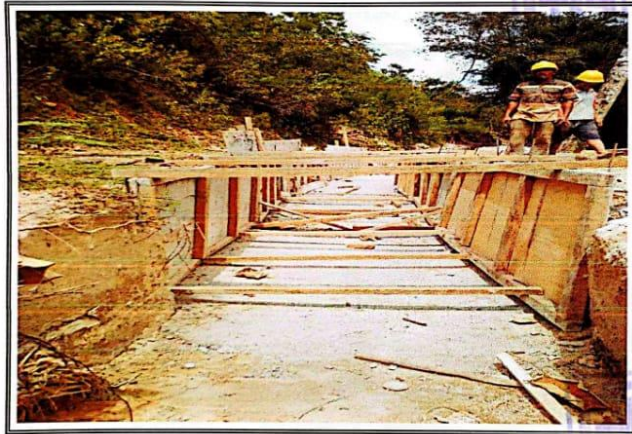

SEDANG
DIKERJAKAN



SEDANG
DIKERJAKAN

Nama Kegiatan : REHABILITASI JARINGAN IRIGASI D.I. NAMO LEMBU KEC JUHAR (LANJUTAN)
Pelaksana : CV KATA KITA



SEBELUM
DIKERJAKAN




SEDANG
DIKERJAKAN




SEDANG
DIKERJAKAN

Nama Kegiatan : REHABILITASI JARINGAN IRIGASI D.1. NAMO LEMBU KEC JUHAR (LANJUTAN)
Pelaksana : CV KATA KITA

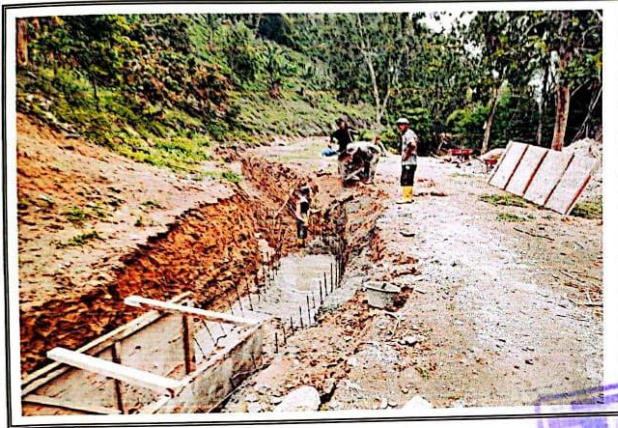


SEDANG
DIKERJAKAN

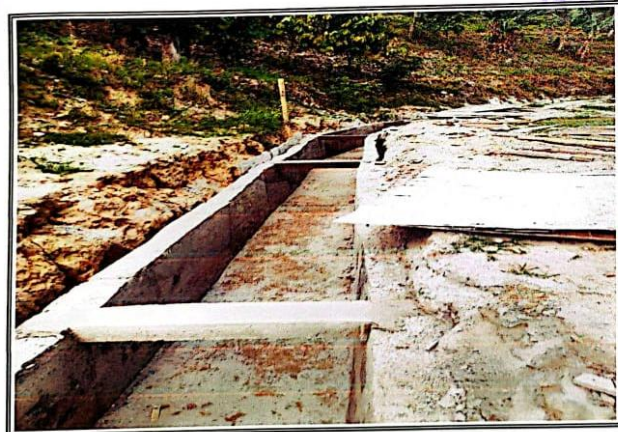


SEDANG
DIKERJAKAN

Nama Kegiatan : REHABILITASI IRIGAS D.I NAMO LEMBU KEC.JUHAR (LANJUTAN)
PELAKSANA : CV.KATA KITA

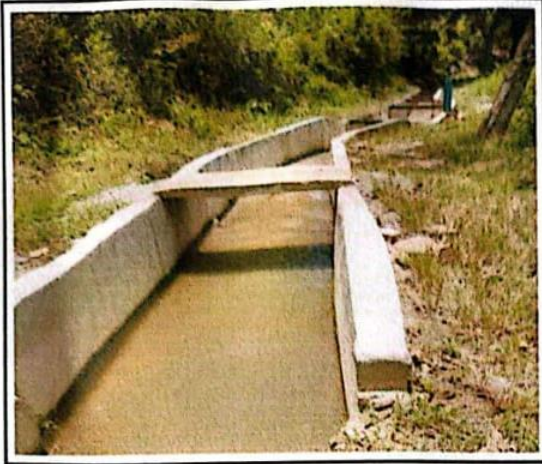


Selesai Dikerjakan

Selesai saluran dimensi 1,5 m x 1 m

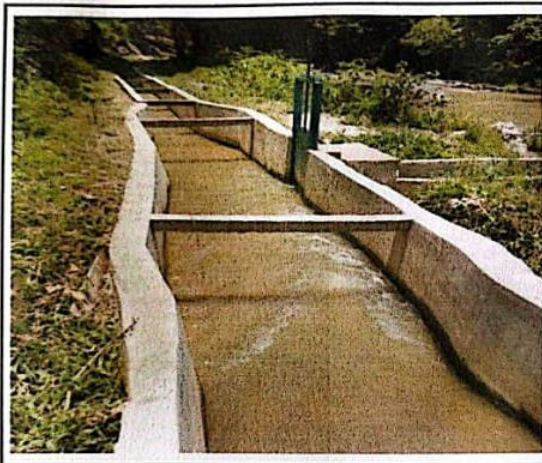

Selesai Dikerjakan

Selesai Pekerjaan Kantong Lumpur

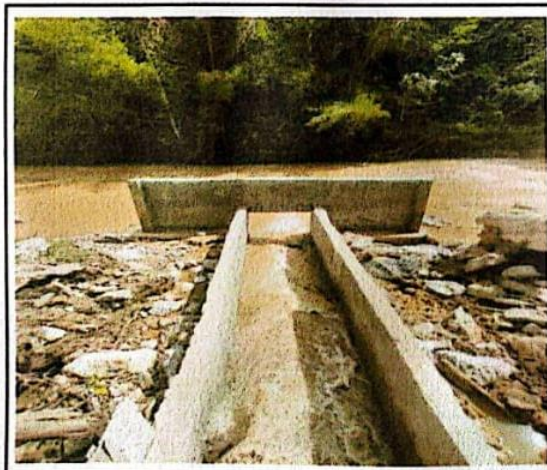

Selesai Dikerjakan

Selesai Pekerjaan Saluran Penguras

Nama Kegiatan : REHABILITASI JARINGAN IRIGASI D.I. NAMO LEMBU KEC JUHAR (LANJUTAN)
Pelaksana : CV KATA KITA


PAPAN PROYEK




PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN TATA RUANG
TAHUN ANGGARAN 2025
KEGIATAN BIDANG SUMBER DAYA AIR

NAMA KEGIATAN	: REHABILITASI JARINGAN IRIGASI D.I. NAMO LEMBU KEC. JUHAR (LANJUTAN)		
NO. KONTRAK	: 610/297/PPK-SDA/2025		
TGL. KONTRAK	: 07 AGUSTUS 2025		
PELAKSANA	: CV. KATA KITA		
	JL. KAPTEN BANGSI SEMBIRING NO. 154 KABANJAHE		
TERDIRI DARI			
	- NILAI FISIK	Rp.	435.900.904,-
	- PPN	Rp.	47.949.099,-
	JUMLAH	Rp.	483.850.003,-
SUMBER DANA	: APBD		
PELAKSANAAN	: - MASA KONSTRUKSI/FISIK : 120 HARI KALENDER		
	: 07 AGUSTUS 2025 s/d 05 DESEMBER 2025		
	: - MASA PEMELIHARAAN : 180 HARI KALENDER		

Diperiksa oleh :
Pelaksana Kegiatan


HELMIN SITEPU, ST
NIP 19790717 20071 1 004

Dibuat Oleh :
CV KATA KITA


PRADA SITEPU
WAKIL DIREKTUR III
